

**ARSENALE MILITARE MARITTIMO
TARANTO**



DOCUMENTO DI INFORMAZIONE

OGGETTO

**REALIZZAZIONE NELLA PLATEA DEL BACINO FERRATI DI UN
CORRIDOIO DI ACCESSO ALLA BARCA-PORTA GP59 E ATTIVITÀ
DI SUPPORTO ALLE VERIFICHE DELL'AZIONE LESIONATE DELLA
STESSA BARCA-PORTA (OFFICINE JOLLY S.R.L.)**

**Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
F.S.T. Ing. Giancarlo CAFORIO**

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIANCARLO CAFORIO

F.S.T.

In Data/On Date:

martedì 2 dicembre 2025 15:23:10

Redatto a cura del: Servizio Prevenzione e Protezione Arsenale M. M. Taranto	DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ALLE DITTE - D.Lgs. 81/2008 Art. 26 comma 1 lett. b -	02 Dicembre 2025
--	--	------------------

PREMESSA

Lo scopo del presente documento è quello di fornire le informazioni, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., relative ai luoghi di lavoro oggetto del contratto e dipendenti dal Datore di lavoro di Marinarsen Taranto, nonché elementi essenziali di conoscenza dell'organizzazione interna dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto.

RIFERIMENTI AL CONTRATTO

Fascicolo 2508/25 Adesione all'Accordo Quadro (A.Q.) n. 327 di Repertorio del 28/01/2025 di MARIUGCRA - Programma di Mantenimento Condizioni Operative (MCO) per i Bacini di carenaggio di MARINARSEN Taranto. Ordine nr. 7.

AREE E LOCALI DOVE POSSONO ESSERE SVOLTI I LAVORI

BACINO FERRATI (C22B).

FIGURE RESPONSABILI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008

Marinarsen ha una struttura gerarchica definita con Decreto Ministeriale (DM) e disposizioni interne. Di seguito vengono riportati i nominativi del Datore di lavoro, dei dirigenti e preposti interessati alla presente attività:

Datore di Lavoro - Direttore protempore dell'Arsenale di Taranto:

C.A. Alessandro BATTAGLIA

Figure di particolare interesse per l'oggetto dei lavori:

Capo Reparto Manutenzioni Navali: CV ACCOTO MARCO tel. 099 775 3940

Capo Sezione Bacini: C.F. Marco BONATTO (Dirigente alla Sicurezza) tel. 099 775 2335

DEC Fascicolo 2508/25: C.F. Nicola BOCCARDI tel. 0997757557

Capo Sezione Reti Elettriche: F.T. Angelo CARDELLICCHIO tel. 099 775 3020

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: F.S.T. Ing. Giancarlo CAFORIO tel. 099 775 3103

Medico competente: Dott. Giovanni TRIA tel. 099 775 4028

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Personale Civile:

- Alessandro SCIALPI
- Giovanni CHIFFI
- Ignazio BARBUTO
- Pietro AVELLINO
- Saverio CAPODIFERRO
- Valentina FALCONE

Personale Militare:

- ----

1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ARSENALE DI TARANTO

Denominazione Ente: **ARSENALE MILITARE MARITTIMO TARANTO (detto anche MARINARSEN TARANTO)**


Ubicazione: **TARANTO**, Piazza **Ammiraglio Pasquale Leonardi** CAP: **74123**

Organo di Vigilanza Competente: **MARIVIGILANZA – AREA SUD – TARANTO**

2) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE, EVACUAZIONE E PRIMO SOCCORSO.

EVACUAZIONE

Di seguito lo stralcio planimetrico del centro di raccolta esterno all'area di lavoro, da raggiungere in caso di evacuazione/emergenza.

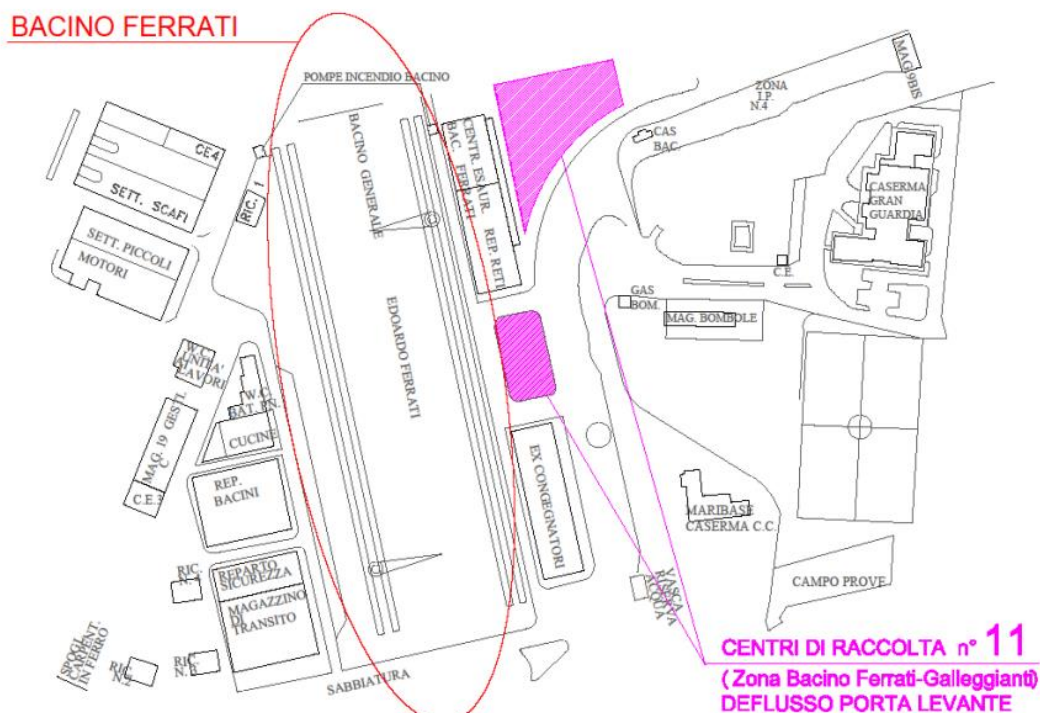

CHIAMATE DI EMERGENZA

EMERGENZA INCENDIO: 115 Vigili del Fuoco

EMERGENZA SANITARIA: 118 Pronto Soccorso

SALA MEDICA ARSENALE tel. 099 775 2841

Primo Soccorso per eventi non gravi solo durante i seguenti orari:

lunedì – giovedì dalle 08.00 alle 16.00

venerdì dalle 08.00 alle 12.00

EMERGENZA ELETTRICA e BACINI DI CARENAMENTO

EMERGENZA ELETTRICA:

⇒ Se necessita l'isolamento della rete elettrica:

⇒ **Guardia Circuiti - Sezione Reti Elettriche:**



da telefono militare: 22604



da cellulare: 099 775 2604

EMERGENZA BACINI DI CARENAMENTO

Per Bacini in Muratura FERRATI:

Durante l'orario di lavoro 08.00 -13.00

da telefono militare: 23765 oppure: 23762

da cellulare: 099 775 3765 oppure: 099 775 3762

Durante il turno di guardia 13.00 – 08.00

da telefono militare: 22916

da cellulare: 099 775 2916

INFORMAZIONE SUGLI ACCESSI NEL COMPRENSORIO

Comunicazione di servizio n°185 del 10/07/2025



ARSENALE MILITARE MARITTIMO TARANTO

COMUNICAZIONE di SERVIZIO N° 185 DEL 10/07/2025

A TUTTO IL PERSONALE tramite invio mail

Argomento: Orari di apertura e chiusura dei varchi di accesso nel Comprensorio Arsenalizio.

Si comunicano i nuovi orari di accesso dai varchi così modificati in vigore dalla data odierna:

PORTA PRINCIPALE

a. Cancello principale

Da lunedì al venerdì

Aperto
Chiuso

dalle ore **06.30** fino alle **14.00**
per il restante orario

Sabato e Festivi

Chiuso

b. Portineria ingresso Tomelli

tutti i giorni lavorativi
sabato e festivi

Aperto
Chiuso

dalle ore **06.40** alle ore **17.00**

c. Varco secondario

Tutti i giorni lavorativi

Aperto

al traffico veicolare
dalle **14.00** alle **21.00**

Chiuso

dopo le ore **21.00** con apertura a
chiamata

sabato

Aperto

al traffico veicolare
dalle **09.30** alle **21.00**

Chiuso

dopo le ore **21.00** con apertura a
chiamata

festivi

Chiuso

con apertura a chiamata

PORTA LEVANTE

dal lunedì al venerdì

Aperto

solo traffico veicolare
dalle ore **06.55** alle ore **17.30**

sabato e festivi

Chiuso

PORTA PONENTE

dal lunedì al venerdì

Chiuso

sabato e festivi

Chiuso

La presente C.d.S. annulla e sostituisce la CdS 37 del 22/02/2024.

IL DIRETTORE
(Amm. Isp. Pasquale de CANDIA)

1 Firmato digitalmente da Signed by:
1 PASQUALE de CANDIA
1 In Data/Ora Data:
1 giovedì 10 luglio 2025 08:07:47
1

Redatto a cura del: Servizio Prevenzione e Protezione Arsenale M. M. Taranto	DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ALLE DITTE - D.Lgs. 81/2008 Art. 26 comma 1 lett. b -	02 Dicembre 2025
--	---	------------------

3) INFORMAZIONI SUI RISCHI

CODIFICAZIONE FATTORI DI RISCHIO

Codice fattore di rischio	Ambiti/luoghi di potenziale rischio
1 – Agenti Biologici	Rischio Biologico.
2 – Agenti Chimici	Residui combustibili / vapori tossici
10 – Apparecchi di sollevamento	PLE, GRU, Autogru.
13 – Impianti Elettrici	Elettrocuzione.
14 – Primo Soccorso	Primo soccorso
15 – Rischio Incendio	Attività comportanti il rischio incendio.
17 – Interconnessione	Strade, marciapiedi, scale, ascensori, sotto servizi stradali.
18 – Locali di Lavoro	Bacino Ferrati (locali esterni – banchine)
23 – Organizzazione del Lavoro	Fattori di rischio trasversali: mansioni lavorative, procedure/attività lavorative, sul Bacino Ferrati.

QUADRO DI SINTESI

1 – Rischio Biologico

La presenza di materiali contaminati, rottami metallici e sedimenti inquinati costituisce un rischio biologico, in quanto aumenta la probabilità di ferite da taglio o abrasioni e, di conseguenza, di contaminazioni. I materiali arrugginiti rappresentano un ulteriore rischio, poiché condizioni ambientali caratterizzate da elevata umidità e scarsa aerazione favoriscono la formazione di biofilm e la proliferazione di microrganismi potenzialmente patogeni.

2 – Rischio Chimico

L'area presenta un rischio chimico legato a residui di idrocarburi, oli, solventi e altre sostanze tossiche o infiammabili, presenti nei sedimenti e nelle acque stagnanti. L'esposizione può avvenire per inalazione di vapori o aerosol, contatto cutaneo con materiali contaminati e tramite indumenti o DPI. La prevenzione richiede monitoraggio continuo delle atmosfere di lavoro, utilizzo di DPI specifici quali maschere filtranti, autorespiratori, guanti e tute impermeabili, protocolli rigorosi di decontaminazione immediata e formazione continua del personale sulle corrette procedure di sicurezza.

10 – Apparecchi di sollevamento – movimentazione carichi

- Non sono presenti linee elettriche aeree che possano interferire con la movimentazione dei carichi presso il BACINO FERRATI.
- Non sono noti i carichi massimi di esercizio sopportabili della banchina del Bacino Ferrati.

Autogru e PLE con conducente:

Prima dell'utilizzo dell'apparecchio di sollevamento occorre che siano consegnati i seguenti documenti da parte del noleggiatore:

<i>Redatto a cura del:</i> Servizio Prevenzione e Protezione Arsenale M. M. Taranto	DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ALLE DITTE - D.Lgs. 81/2008 Art. 26 comma 1 lett. b -	02 Dicembre 2025
--	--	--------------------------------

- Dichiarazione di conformità alle norme europee specifiche di prodotto dell'apparecchio noleggiato, con riscontro della marcatura CE e del registro di uso e manutenzione.
- Verbale dell'ultima verifica periodica di legge con verifica della data di scadenza (annuale, o biennale secondo tipologia dell'apparecchio ed anno di immatricolazione).
- Dichiarazione del noleggiatore di regolare effettuazione della manutenzione ai fini della sicurezza dell'apparecchio di sollevamento e relativi accessori, compreso i dispositivi di sicurezza.
- Certificazione CE degli accessori di sollevamento.
- Copia dell'attestato di abilitazione del conduttore, relativo all'apparecchio di sollevamento utilizzato.
- La conduzione e l'utilizzo degli apparecchi di sollevamento può essere effettuato soltanto dal personale dotato della relativa abilitazione.
- Nel caso di utilizzo di autogru, è vietato posizionare gli stabilizzatori senza le piastre in dotazione alla gru ed in prossimità del margine della banchina o su piani non resistenti, quali beole, coperture dei cunicoli o cavidotti, grigliato. Non sono note le portate massime di carico in banchina.
- È vietato movimentare carichi con personale presente nell'area sottostante. Le attività devono essere sempre supervisionate da un preposto che garantisca l'interdizione dell'area e la comunicazione efficace tra operatori.
- Si raccomanda di rispettare i divieti e le prescrizioni se l'attività da svolgere prevede lo stazionamento nei pressi d'apparecchiature od attrezzature in genere. Non stazionare od operare nel raggio d'azione dei mezzi di sollevamento ed in particolare nelle aree scoperte destinate alle lavorazioni, banchine lavori, piazzali antistanti alle officine, piazzali nei pressi dei bacini in muratura, ecc. (aree pericolose).

Attuare, inoltre, le seguenti misure:

- informazione e formazione del personale;
- gli operatori ed il gruista devono comunicare mediante comunicazione gestuale codificata o ricetrasmittenti radio;
- interdizione di aree sottostanti i lavori in altezza.

Obbligatorio l'uso dei seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI):

- elmetto di protezione;
- guanti per il rischio meccanico;
- calzature di sicurezza con puntale in acciaio ed a sfilamento rapido.

13 – Impianti elettrici

- La posa dei cavi non dovrà interferire con il camminamento dei lavoratori e la movimentazione dei carichi.
- Tutte le apparecchiature devono essere conformi CE e norme CEI applicabili, con prolunghe industriali integre.

14– Primo Soccorso

Dovrà essere sempre presente una gru per assicurare un tempestivo recupero in sicurezza di eventuali lavoratori infortunati, necessario per ridurre tempi di intervento e minimizzare i rischi in caso di incidenti.

Il personale incaricato sarà adeguatamente formato ed informato sulle procedure di utilizzo e sulle modalità di intervento d'emergenza.

15 – Rischio incendio

- Prima dell'inizio attività verificare l'assenza di vapori infiammabili residui.
- L'impianto antincendio del BACINO FERRATI non è disponibile.
- La Ditta esecutrice deve dotarsi di estintori supplementari idonei, posizionati in prossimità dell'area di lavoro.
- Vietato l'uso di fiamme libere.

17 – Interconnessione e viabilità

Per le strade e le banchine nel Compensorio non sono note le informazioni circa i carichi massimi sopportabili delle stesse massicciate, né la dettagliata distribuzione degli impianti di servizio presenti sotto il manto stradale. Prestare la massima attenzione durante il transito veicolare nei pressi delle aree cantierizzate per eventuali rischi da interferenza dovuti al transito dei mezzi di lavoro Marinarsen o per il transito degli automezzi privati. Il limite di velocità sulle strade interne è di 20 Km/h.

- Il percorso stradale all'interno del compensorio può presentare dei rischi perché alcuni tratti sono interessati da buche sull'asfalto e beole parzialmente danneggiate. L'altezza massima dei mezzi consentita per la circolazione all'interno del compensorio è di 4,25 m, ma nel solo tratto che conduce da porta Levante al Piazzale Rottami tale limite è elevato a 4,50 m. Per automezzi di altezza maggiore, va verificato il percorso stradale e l'eventuale presenza di cavi o chioma di alberi che ne possano limitare il transito. Il transito pedonale esterno deve avvenire esclusivamente nelle aree consentite e sui marciapiedi; l'attraversamento di strade e vie devono avvenire esclusivamente sulle apposite zebraure pedonabili.
- Rispettare i divieti ed i percorsi stradali disposti nei pressi delle aree cantierizzate. Durante le attività di competenza non ingombrare con la propria attrezzatura le vie di evacuazione, non impedire l'accesso ai presidi antincendio, non ostacolare il transito di automezzi per l'emergenza e primo soccorso.

ALTEZZA MASSIMA VEICOLARE CONSENTITA



VELOCITÀ MASSIMA VEICOLARE CONSENTITA 20 KM/H.



Redatto a cura del: Servizio Prevenzione e Protezione Arsenale M. M. Taranto	DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ALLE DITTE - D.Lgs. 81/2008 Art. 26 comma 1 lett. b -	02 Dicembre 2025
--	---	-------------------------

- Lo Stabilimento presenta anche zone pedonabili sconnesse con un reale pericolo d'inciampo. È vietato il transito pedonale nelle aree di lavorazione, ivi comprese banchine e bacini, anche se non vi sono navi ormeggiate.
- Prestare attenzione durante il transito sulle scale esterne, perché possono essere rese scivolose dall'umidità notturna. Attenzione anche lungo i marciapiedi per la presenza di tombini e grigliati che talvolta possono essere rotti o sconnessi e non opportunamente segnalati.
- Prestare attenzione durante il transito veicolare per la presenza in alcuni tratti stradali di beole rotte/lesionate e dissesto della pavimentazione; il transito veicolare dei mezzi pesanti deve essere effettuato da Porta Levante.

18 – Locali di lavoro

Il bacino Ferrati presenta i seguenti pericoli:

- Pericolo di caduta dai gradoni;
- Pericolo di scivolamento e caduta;
- Pericolo di caduta di materiale dall'alto;
- Pericolo di inciampo e caduta.
- Pericolo di rischio interferenza con altro cantiere in corso (esempio attività di posa taccate o interventi di pulizia in platea).
- Pericolo di allagamento in caso di eventi catastrofici (terremoto, cedimenti strutturali, maremoto).

Misure:

È vietato l'ingresso dell'area di cantiere ai non addetti ai lavori.

All'interno del bacino muoversi con grande cautela, indossando i DPI previsti (elmetto di sicurezza e scarpe antinfortunistiche), seguendo sempre i percorsi segnalati; in caso di dubbi contattare il Capo Nucleo Bacini.

I lavori di movimentazione carichi possono comportare rischio di caduta di oggetti dall'alto. Per lavori in quota, si rappresenta la necessità di adempiere a tutte le prescrizioni previste dalle attuali normative, che regolamentano i lavori in altezza superiori ai 2 metri. In tutti i luoghi esterni è vietato utilizzare ponti mobili su ruote (trabattelli) per lavori in quota superiore a 8 m.

Prima dell'inizio dei lavori coordinare con i responsabili delle unità lavorative specifiche, eventuali interventi di prevenzione e protezione.

È vietato utilizzare locali e attrezzature/impianti se non autorizzati; l'autorizzazione deve essere rilasciata in forma scritta. Vietato effettuare lavori sulla barca porta operativa.

È vietato accedere all'interno del Bacino: nel caso sia necessario accedere attuare quanto previsto dalla Valutazione del rischio del luogo di lavoro, disponibile presso la Sezione Bacini (CF Bonatto, FT Iaia).

23 – Organizzazione del lavoro

Sulla PLE possono salire esclusivamente il manovratore abilitato e gli operatori incaricati di assistere alle fasi di lavoro, entrambi in possesso di formazione specifica, idoneità sanitaria, addestramento pratico e dei DPI anticaduta previsti (casco di protezione, imbracatura di sicurezza con dispositivo anticaduta, guanti e calzature antiinfortunistiche).

Rispettando le procedure operative e le norme di sicurezza:

Redatto a cura del: Servizio Prevenzione e Protezione Arsenale M. M. Taranto	DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ALLE DITTE - D.Lgs. 81/2008 Art. 26 comma 1 lett. b -	02 Dicembre 2025
--	---	------------------

- Nessun operatore della ditta è autorizzato ad accedere alla platea o ad altre aree non autorizzate senza preventiva autorizzazione scritta e senza essere accompagnato da un rappresentante di Marinarsen (fare riferimento al DEC, CF Boccardi).
- Le attività devono essere sempre supervisionate da un referente del Bacino, in stretto coordinamento con il DEC.
- È obbligatorio mantenere le vie di accesso sempre libere per consentire l'agevole transito dei mezzi di soccorso.

Tutto il personale ammesso presso l'Arsenale deve essere formato e aggiornato alla sicurezza con i corsi previsti dalla legge e deve essere identificabile tramite tesserino con fotografia. Devono inoltre essere informati sulle prescrizioni del presente documento. I numeri di emergenza devono essere riportati anche nella segnaletica di cantiere.

Il preposto deve garantire l'osservanza degli obblighi di legge, l'uso dei DPI e segnalare al Dirigente eventuali inosservanze.

È obbligatorio l'uso di: elmetto di protezione, guanti resistenti ad oli/idrocarburi, stivali antiscivolo, calzature di sicurezza a sfilamento rapido e giubbino salvagente per chi opera vicino all'acqua.

Tutti i lavoratori devono aver ricevuto formazione specifica per i lavori in ambienti portuali e la gestione delle emergenze.

Non tutte le scale del bacino rispettano le norme tecniche inalzata e pedata; prestare massima attenzione al rischio di caduta.

Lo stoccaggio di materiali e rifiuti deve essere ordinato, segnalato e non deve creare intralcio alla percorribilità di platea e banchine. Mantenere puliti gli spazi con rimozione quotidiana dei residui e raccolta rifiuti.

Transennare e segnalare sempre le aree di lavoro per impedire l'accesso ai non addetti.

A tutti i lavoratori è vietato l'uso di bevande alcoliche, con particolare riferimento agli autisti, ai manovratori di gru, ponti sviluppabili su carro, carrelli elevatori, lavoratori che utilizzano trabattelli o effettuano lavoro in quota e tutte le attività che possano mettere a rischio la salute e la sicurezza degli altri lavoratori.
